

„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Batorz” - coraz bliżej budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków



Prace nad powyższym projektem są już na zaawansowanym etapie.

Wymieniona została sieć wodociągowa na odcinku od budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Batorzu do terenu kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Batorz Pierwszy.

Koniecznym stało się wykonanie hydrantu przeciwpożarowego na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego.

Dostarczono oczyszczalnię kontenerową, obecnie trwa jej montaż.












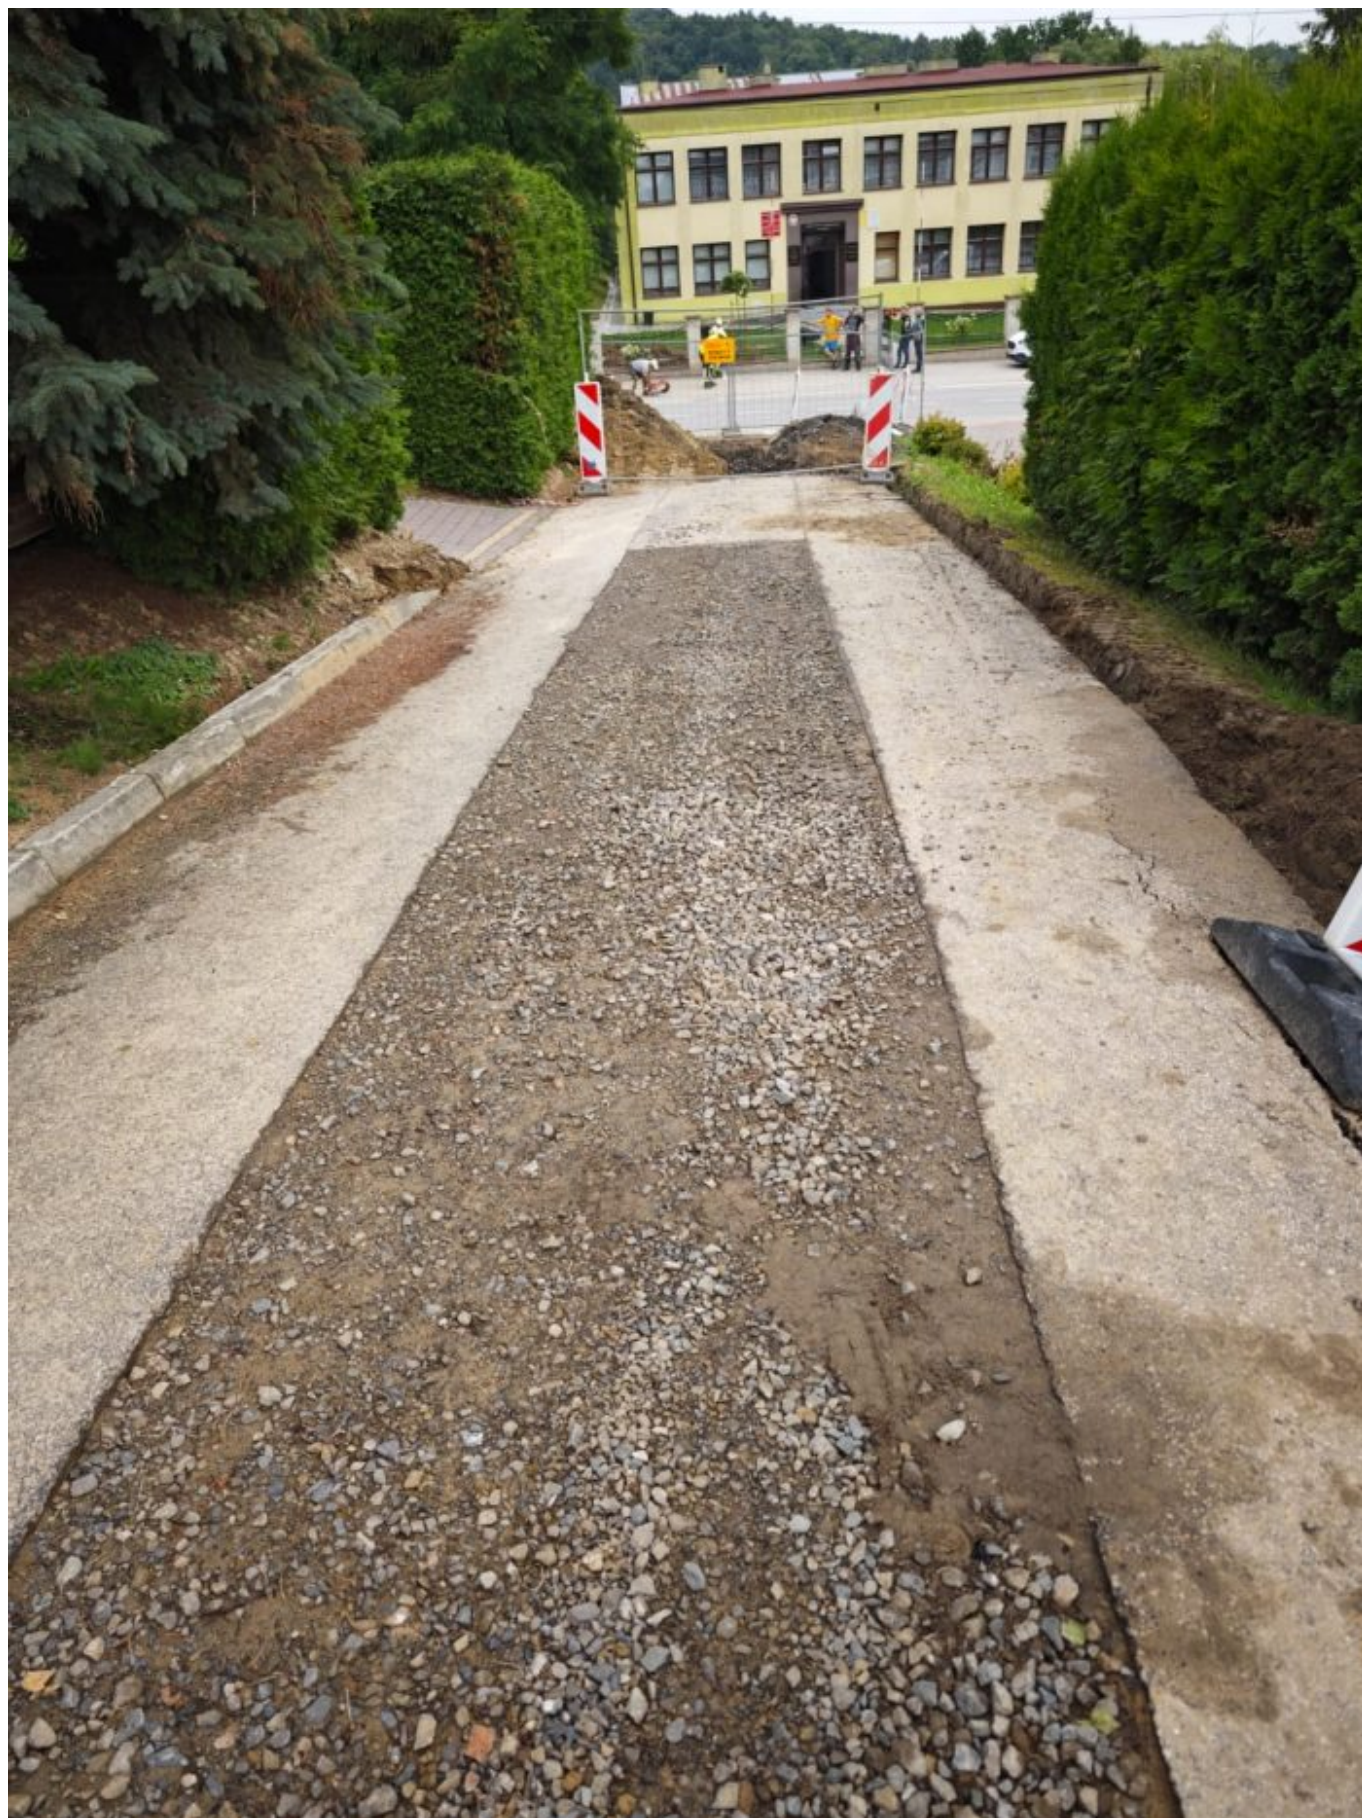

Trwają również prace nad wykonaniem kanalizacji w miejscowości Batorz Pierwszy - prace te są praktycznie na ukończeniu. Ponadto wykonano niezbędne przewiertki pod drogami powiatowymi oraz gminnymi.

Planowany termin zakończenia inwestycji - wrzesień 2025.







